



GAZİANTEP
ÜNİVERSİTESİ

YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2015 YILI
BİRİM FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER	4
A. Misyon ve Vizyon	4
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	5
C. İdareye İlişkin Bilgiler	5
1- Fiziksel Yapı (Açık Alanlar)	6-7
1.1 Kapalı Alanlar	8-11
1.2 Taşıtlar	12-13
1.3 Lojmanlar	14
1.4 Eğitim Alanları, Derslikler ve Ofisler	14
2- Örgüt Yapısı	15
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	16
3.1 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	16
3.2 Tesis, Makine ve Cihazlar Listesi	17-19
4- İnsan Kaynakları	20
4.1 İdari Personelin Eğitim Durumu	20
4.2 İdari Personelin Hizmet Süreleri	20
4.3 İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı	20
5- Sunulan Hizmetler	22-51
II- AMAÇ VE HEDEFLER	52
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	
A- Mali Bilgiler	
1- Bütçe Uygulama Sonuçları	53
2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi	54-57
IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	
A-Üstünlükler	58
B- Zayıflıklar	58
C- Değerlendirme	58
V-ÖNERİ VE TEDBİRLER	59

Yapı İşleri Teknik Dairesi Başkanlığı; Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı onarımları ile ilgili ihaleleri yürütmek, Üniversitemiz Gaziantep Merkez kampus ve ilçelerde bulunan kampüslere ait arazilerin kamulaştırma çalışmalarını yürütmek, kampus peyzaj planlarını hazırlayıp zemine uygulamak, inşaatları kontrol etmek, tamamlanan inşaatları teslim almak, eskiyen binaların bakım ve onarım işlerini yapmaktadır. Üniversitemizin kendi birimleri içinde ve haricinde haberleşmeyi sağlamak, iletişim ağını, güçlendirmek, arızaları gidermekte ve yeni telefon hatları oluşturmaktadır. Ayrıca binaların ısıtılması, gerekli yerlere sıcak suyun verilmesi, kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, merkezi havalandırma sistemleri, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütür ve sonuçlandırır.

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığına bağlı birimler ve Şube Müdürlükleri:

Yatırım İnşaat Şube Müdürlüğü, İhale Şube Müdürlüğü, Mekanik Şube Müdürlüğü, Tesis İşletme Şube Müdürlüğü, Taşıt İşletme Şube Müdürlüğü ve Park Bahçeler Birimidir.

İrfan KORKMAZ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

I- GENEL BİLGİLER

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığımız; Üniversitemizde eğitim gören öğrencilere, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren akademik personele, Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda özveriyle çalışan idari personele, hastanelerimizden faydalanan hasta ve hasta yakınlarına teknik konularda en iyi şekilde hizmet verebilecek ve kurumumuzun üretkenliğini arttıracak teknolojiyi, yapılaşmayı ve gerekli altyapıyı sağlamakla görevli birimdir.

A. Misyon ve Vizyon

Misyon

Ülkemizin ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak dünyadaki gelişmeleri en verimli şekilde değerlendirip, üniversitemizin üretkenliğini ve toplumsal hizmetlerini arttırarak sürdürmesini sağlayabilecek her türlü teknik hizmeti vermeyi görev edinmiştir. Gerekli yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermek, mevcut personel ve ekipman ile sorumlu olduğumuz alanlarda çalışmak, sorunlara çözüm bulmak; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak fiziki mekanlar yapmak. Bunları da Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun şekilde tesis etmektir.

Vizyon

Üniversitemizin ihtiyaçları ve vizyonu doğrultusunda, tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, alt yapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlayabilmek, tüm dünyadaki gelişmeleri takip ederek üniversitemizi ve dolayısıyla ülkemizi geleceğe en iyi ,en doğru, en ekonomik şekilde hazırlayabilmek için Mevcut Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde çağdaş bir yapılanma sağlamaktır.

Yapı işleri ve Teknik Dairesi Başkanlığımız; üniversite yapılarının inşaat ve onarım işlerini, kaliteli malzeme ve işçilikle, işin süresi içinde eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde planlayıp işin bitirilmesini sağlayarak, üniversitemizin hizmetine sunulmasına yardımcı olmaktadır

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı Üniversitemizin; kendi mülkiyetine, maliye hazinesine ve diğer mülkiyetlere kayıtlı arsa ve arazileri üzerindeki eğitim-öğretim, sağlık, beslenme, barınma, yatırım programlarının hazırlanmasını, ihale ve denetleme işlerinin yapılmasını, mevcut personel ile; sorumlu olduğumuz alanlarda, hızlı servis hizmeti ile, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmayı hedeflemektedir. Yeterli olmayan personel ve ekipman ile, tasarruf tedbirleri sebebiyle zaman zaman istenilen hizmetlerde yaşanan gecikmeleri en aza indirmek için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığımızın görev alanları oldukça geniş yelpazededir.

- Mevcut olan kapalı ve açık alanlara ilaveten ihtiyaçlar doğrultusunda, açık spor tesisleri dahil yeni binalar ve bloklar yapılmasını,
- Mevcut bina ve blokların tadilat ve büyük onarımları ile küçük onarımlarını,
- Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, haberleşme gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatlarının yenilenmesini işletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını ve yine arızaların giderilmesini,
- Çeşitli sebeplerle yüklenici vasıtasıyla gerçekleştirilemeyen açık ve kapalı alanlardaki tadilat ve onarım hizmetlerini,
- Kampüs içi ana ve ara bağlantı yolları, tören alanları ile kaldırımlar dahil çevre düzenlenmesini,
- Personel taşıma hizmetlerine yönelik günlük kontrolleri,
- Başkanlığımız hizmet araçları ile ulaşım hizmetlerini gerçekleştirdiğimiz araç ve makine parkının rutin bakım ve onarımlarını,
- Tadilat ve ıslah imar planlarını,

C. İdareye İlişkin Bilgiler

Yapı İşleri Teknik Dairesi Başkanlığına bağlı birimler ve Şube Müdürlükleri:

- Yatırım İnşaat Şube Müdürlüğü,
- Mekanik Şube Müdürlüğü,
- İhale Şube Müdürlüğü
- Tesis İşletme Şube Müdürlüğü,
- Taşıt İşletme Şube Müdürlüğü,
- Park Bahçeler Birimidir.

1-1 Açık ve Kapalı Alanlar

Tablo 1.1. Gaziantep Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı *

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m²)			Toplam (m²)	Açıklama
	Üniversite	Maliye Haz.	Diğer		
G.Ü. MERKEZ KAMPÜSÜ <u>Mülkiyeti G.Ü. Ait olanlar</u> 5034 Ada -1 parsel =842.095,84 m² 5034 Ada -2 Parsel = 3.795,87 m² 715 ada – Parsel 1= 163.138,24 m² (Teknopark) 714 Ada –1 Parsel = 28.587,96 m² (Teknopark Yanı) Kamulaştırmalar = 41.629,02 m² ODTÜ devir –885 parsel= 12.880,00 m² <u>Maliye hazinesine ait G.Ü. Tahsisli</u> 5034 Ada-1 parsel = 243.6101,00 m² Deneysel ekim alanı 27 parça=76.512,00 m² Fıstıklık Hastane Arkası: 3554 Ada 302 parsel = 58.000,00 m² Turizm Otelcilik MYO Alanı 251 Ada-3,4,5,6 nolu parseller toplam = 21.630,65 <u>İl Özel İdareye ait G.Ü. Tahsisli</u> 5034 Ada -1 Parsel = 35.061,88 m²	1.092.126,93	399.752,62	35.061,62 (İl Özel İdaresi)	1.526.941,17	5034 ada 1 parsel nolu Taşınmazdan; Kredi ve Yurtlar Kurumuna yurt yapımı için 2009 yılında 30.000 m² 2013 yılında 7.500 m² tahsis edildi.
G.Ü. ONKOLOJİ HASTANESİ			20.799,00	20.799,00	Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumundan tahsisli.
G.Ü. KÜÇÜKKIZILHİSAR ÜNİVERSİTE ALANI		131.620,00		131.620,00	
SARISALKIM MAH. (ALLEBEN GÖLETİ)			3.019,18	3.019,18	Eğitim ve Su Sporları Müsabakalarında Kullanmak Üzere Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden Kiralanmıştır.
G.Ü. NACİ TOPÇUOĞLU MYO.			31.349,77	31.349,77	Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden Tahsisli
G.Ü. OĞUZELİ MYO.	10.657,15	9.177,79		19.834,94	
HANGAR			1.600,00	1.600,00	Pilotaj eğitimi için Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından kiralanmıştır
G.Ü. NURDAĞI MYO.		470.495,00		470.495,00	

NURDAĞI M.Y. O. SU KUYUSU	4.110,00			4.110,00	
G.Ü. İSLÂHİYE İ. İ. B. FAKÜLTESİ 101 ada 1 parsel = 169.928,10 m ² 164 ada 1 parsel = 335,97 m ²		170.264,07		170.264,07	-İfraz sonucu 131 ada 1 parsel 188,753.00 m ² ; 101 ada 1 parsel, 163 parsel ve 164 nolu parsellere dönüştü. -163 nolu parsel 7.785,40 m ² yurda tahsis edildi.
İSLÂHİYE MESLEK YÜKSEK OKULU -Beyler Mah. 122 Ada 33 parsel = 167.990,00 m ² - Fevzi çakmak mah. 609 ada 1 parsel = 8.475,28 m ²		176.465,28		176.465,28	Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden Devir
ARABAN MESLEK YÜKSEK OKULU Yeni Altıntaş Mah. 2308 parsel=12.261,54m ² Doğan Mah. 48 parsel=84.600,00 m ² Muratlı Mah. 556 parsel=20.742,59 m ²		117.604,13		117.604,13	
G.Ü. NİZİP MYO + EĞİTİM FAKÜLTESİ 131 Ada 5 parsel = 7.775,51 m ² 131 Ada 7 parsel = 427.361,66 m ² 152 Ada 4 parsel = 4.974,99 m ² 153 Ada 1 parsel = 281.663,80 m ² 133 Ada 49 parsel = 70.566,50 m ² 133 Ada 53 parsel = 3.404,45 m ² 133 ada 54 parsel = 4.357,20 m ² 133 Ada 55 parsel = 3.457,60 m ² 133 Ada 56 parsel = 3.440,85 m ²		807.002,56		807.002,56	133 Ada 49 parsel ifraz sonucu: 133 ada 49.53.54,55ve 56 nolu parseller oluşmuştur.
TOPLAM	1.106.894,08	2.282.381,45	91.829,57	3.481.105,10	

Tablo 1.2. Gaziantep Üniversitesi Kapalı Alanlarının Dağılımı *

YERLEŞKE ADI	Kapalı Alan Miktarı (m ²)			TOPLAM (m ²)
	ÜNİVERSİTE	MALİYE HAZİNE	DİĞER	
**G.Ü. Merkez Kampusu	379.708	8300	957	388.965
G.Ü. Onkoloji Hastanesi	8.182			8.182
G.Ü. Naci Topçuoğlu M.Y. O.	10.535			10.535
G.Ü. Oğuzeli M.Y. O.	5.650			5.650
G.Ü. Nurdağı M.Y. O. (Nurdağı Belediyesinden Tahsisli)			2.100	2.100
G.Ü. İslâhiye İkt. İd. Bil. Fak.	5.650			5.650
G.Ü. İslâhiye M.Y. O. (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden Devir)			3.810	3810
G.Ü. Araban M.Y. O.	3.600			3.600
G.Ü. Nizip M.Y. O.	6.250			6.250
G.Ü. Nizip Eğitim Fak.	5.650			5.650
TOPLAM	425.225	8.300	6.867	440.392

** Merkez Kampüs'e; Cenani konağı 1 = 707 m², Cenani Konağı 2 = 530 m² ve Havra Binası = 957 m² kapalı alanları da dahil edilmiştir.

Tablo 1.3. Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı *(m²)

BİRİMLER	EĞİTİM	İDARİ BİNALAR	SOSYAL ALANLAR	SPOR ALANLARI	TOPLAM
İDARİ BİRİMLER					
REKTÖRLÜK		4.200			4.200
MÜHENDİSLİK FAK. DEKAN.		1.663			1.663
TESİS İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ+ATÖLYE BİNALARI+TAŞIT İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ+ISI SANTRALİ		6.994	4200		11.194
BİLGİ İŞLEM D. BŞK.		3.500			3.500
SAĞL. KÜLT. ve SPOR D. BŞK.ve İD. MALİ İŞL. DAİ. BŞK.		2.100			2.100
KÜTÜPHANE ve DÖK. D. BŞK.		6.910			6.910
İD. MALİ İŞL.D.BŞK.(Matbaa)		865			865
İDARİ BİNA		6.654			6.654
TOPLAM		32.886	4200		37.086

FAKÜLTELER					
TIP FAKÜLTESİ	6.690	1.200			7.890
TEMEL TIP BİLİMLERİ	13.110	1.290			14.400
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ	10.790	1.750			12.540
EĞİTİM FAKÜLTESİ	7.060	3.500			10.560
İKTİSADİ ve İDARİ BİL. FAK.(5300 m²) ve YENİ BİNA(5650 m²)	10.950				10.950
İSLÂHİYE İKT. İD. BİL. FAK.	5.650				5.650
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	16.500				16.500
SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU +YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	6520				6.520
HUKUK, İLETİŞİM FAK.	1.350				1.350
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ + EK BİNASI	4.590				4.590
İLAHİYAT FAK.	8.000				8.000
GÜZEL SAN. FAK. (Gastronomi)	600				600
NİZİP EĞİTİM FAK.	5.650				5.650
TOPLAM	97.460	7.740			105.200
MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİ					
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ + LABORATUVAR	8.450				8.450
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ	11.440	3.800			15.240
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ	1.750				1.750
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ	4.250				4.250
GIDA MÜHENDİSLİĞİ	5.250				5.250
FİZİK MÜHENDİSLİĞİ	3.100				3.100
FİZİK MÜH. EK BİNASI	1.370				1.370
ELEKT –ELEKTRONİK MÜH	4.690	1.750	410		6.850
TOPLAM	40.300	5.550	410		46.260
YÜKSEKOKULLAR					
BEDEN EĞİTİM ve SPOR Y.O.	4.900				4.900
YABANCI DİLLER Y.O.	7.650				7.650
SAĞLIK Y.O.	2.800				2.800
TMD KONSERVATUARI	3.700				3.700
TOPLAM	19.050				19.050
MESLEK YÜKSEK OKULLARI					
GAZİANTEP M.Y. O.	15.905	3.500			19.405
TURİZM OTELCİLİK M.Y. O.	8300				8.300

NURDAĞI M.Y. O.	2.100				2.100
İSLÂHİYE M.Y. O.	3.810				3.810
NACİ TOPÇUOĞLU M.Y. O.	10.535				10.535
ARABAN M.Y. O.	3.600				3.600
NİZİP MYO.	5.260	990			6.250
OĞUZELİ MYO	5.650				5.650
TOPLAM	55.160	4.490			59.650
HASTANELER					
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	82.810				82.810
ONKOLOJİ HASTANESİ	8.182				8.182
TOPLAM	90.992				90.992
MERKEZİ DERSLİKLER					
75.YIL MERKEZİ DERSLİK	2.600				2600
TOPLAM	2.600				2.600
DİĞERLERİ					
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ			3.090		3.090
80.YIL KÜLTÜR MERKEZİ			2.800		2.800
MERKEZİ KAFETERYA			7.230		7.230
HASTA REFAKATÇI EVİ			950		950
TEKMER		1.700			1.700
YENİLİK MERKEZİ		1.300			1.300
KAPALI SPOR SALONU				1.375	1.375
LOJMANLAR			9.200		9.200
SEYİRTEPE			1.250		1.250
ARAZİ DEĞERLENDİRME MÜHENDİSLİĞİ		280			280
ÇOBANEVİ			570		570
KREŞ			740		740
ÇAMLITEPE TESİSLERİ (Misafirhane)			440		440
CENANİ KONAĞI 1			707		707
CENANİ LONAĞI 2			530		530
SPOR KOMPLEKSİ				9.700	9.700
2 NOLU YEMEKHANE BİNASI			4.450		4.450
KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ			14.782		14.782
AMFİ TİYATRO			3.655		3.655
TEKNOPARK + YENİ BİNA			9.150		9.150
ÇARŞI KOMPLEKSİ			4.500		4.500
BENZİN İSTASYONU (OPET)			198		198

**HAVRA BİNASI			957		957
TOPLAM		3.280	65.199	11.075	79.554
GENEL TOPLAM	305.562	53.946	69.809	11.075	440.392

AÇIKLAMALAR:

** K lt r ve Sanat Merkezi olarak kullanmak  zere, Havra Binası 04.12.2012 tarihinde Vakıflar Genel M d rl ğ nden kiralanmıřtır.

Gaziantep MYO İktisadi İdari Bilimler Programı Binası (1.700 m²) yıkılmıř olup, 21.105 m² kapalı alana sahip Gaziantep MYO alanından d ř lm řt r. (21.105-1.700 = 19.405 m²)

1.2- Taşıtlar

Tablo 4. Taşıtlar			
Taşıtın Cinsi	Göreve Tahsis Edilmiş, Kuruma Ait Taşıtlar	Göreve Tahsis Edilmiş, Hizmet Alımı Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar	Adet
Binek Otomobil (237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan Makamlar ile Devlet Protokol Hizmetlerinde kullanılmak üzere Dışişleri Bakanlığınca satın alınacak taşıtlar için).			
Binek Otomobil(237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan ilk üç sıradaki Makamlar için.)			
T2-Binek Otomobil	13		13
T3-Station-Wagon	3		3
Arazi Binek (En az 4, en çok 8 kişilik)			
T5-Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	5		5
Kaptı Kaçtı (Arazi)			
T7-Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	6		6
Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik)			
T9-Panel	3		3
T10-Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)	2		2
T11-Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)	9		9
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg			
T14-Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg	2		2
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg			
T15-Ambulans (Tıbbi donanımlı)	4		4
Ambulans arazi hizmetleri için			
Pick-up (Kamyonet) cenaze arabası yapılmak üzere			
Motorsiklet en az 45-250 cc.lik			
Motorsiklet en az 600 cc.lik			

Bisiklet			
Güvenlik önlemleri taşıma otomobili (Cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığınca belirlenir.)			
Güvenlik önlemleri taşıma taşıtı (Cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığınca belirlenir.)			
İş makinesi JCB	1		1
Mini loder	1		1
Hidrolik plantkom	1		1
İtfaiye aracı	3		3
Traktör (5 adet ATV motor)	11		11
Yol Süpürme aracı	1		1
Yol süpürgesi			
Toplam	60		60

NOT: 5 adet ATV motor ruhsatta traktör görünür.


1.3-Lojmanlar

1.2.3. Lojmanlar				
Lojman Tipi	Lojman Sayısı	Sayısı (Adet)		Kapalı alanı (m ²)
		Dolu	Boş	
A TİPİ (Dublex)	8	6	2	150 m ² (1 dublex)
B TİPİ (5 katlı 10 daireli 8 blok)	80	80	0	100 m ² (1 daire)
Toplam		86	2	

1.4- Eğitim Alanları, Derslikler ve Ofisler

1.1.2. Ofis Alanları			
Alt Birim	Ofis Sayısı	m ²	Açıklamalar
Başkanlık Binası	1 Başkan ofisi, 3 Müdür ofisi, 1 Şef ofisi, 14 İdari Personel Ofisleri Diğer (arşiv, depo,v.s.)	37 55 20 300 788	
Bağlı Birimler İdari Personel Ofisleri	55	2458	*Tasıt İşletme İdare Binası: 177 m ² (5 ofis) *Tesis İşletme Bakım Onarım İdare Binası : 870 m ² (14 ofis) *Isı Santrali İdare Binası: 33 m ² (3 ofis) *Telefon Santrali: 73m ² (5 ofis) *Arazi Değerlendirme: 55m ² (3 ofis)
Toplam	74	3658	

2- Örgüt Yapısı

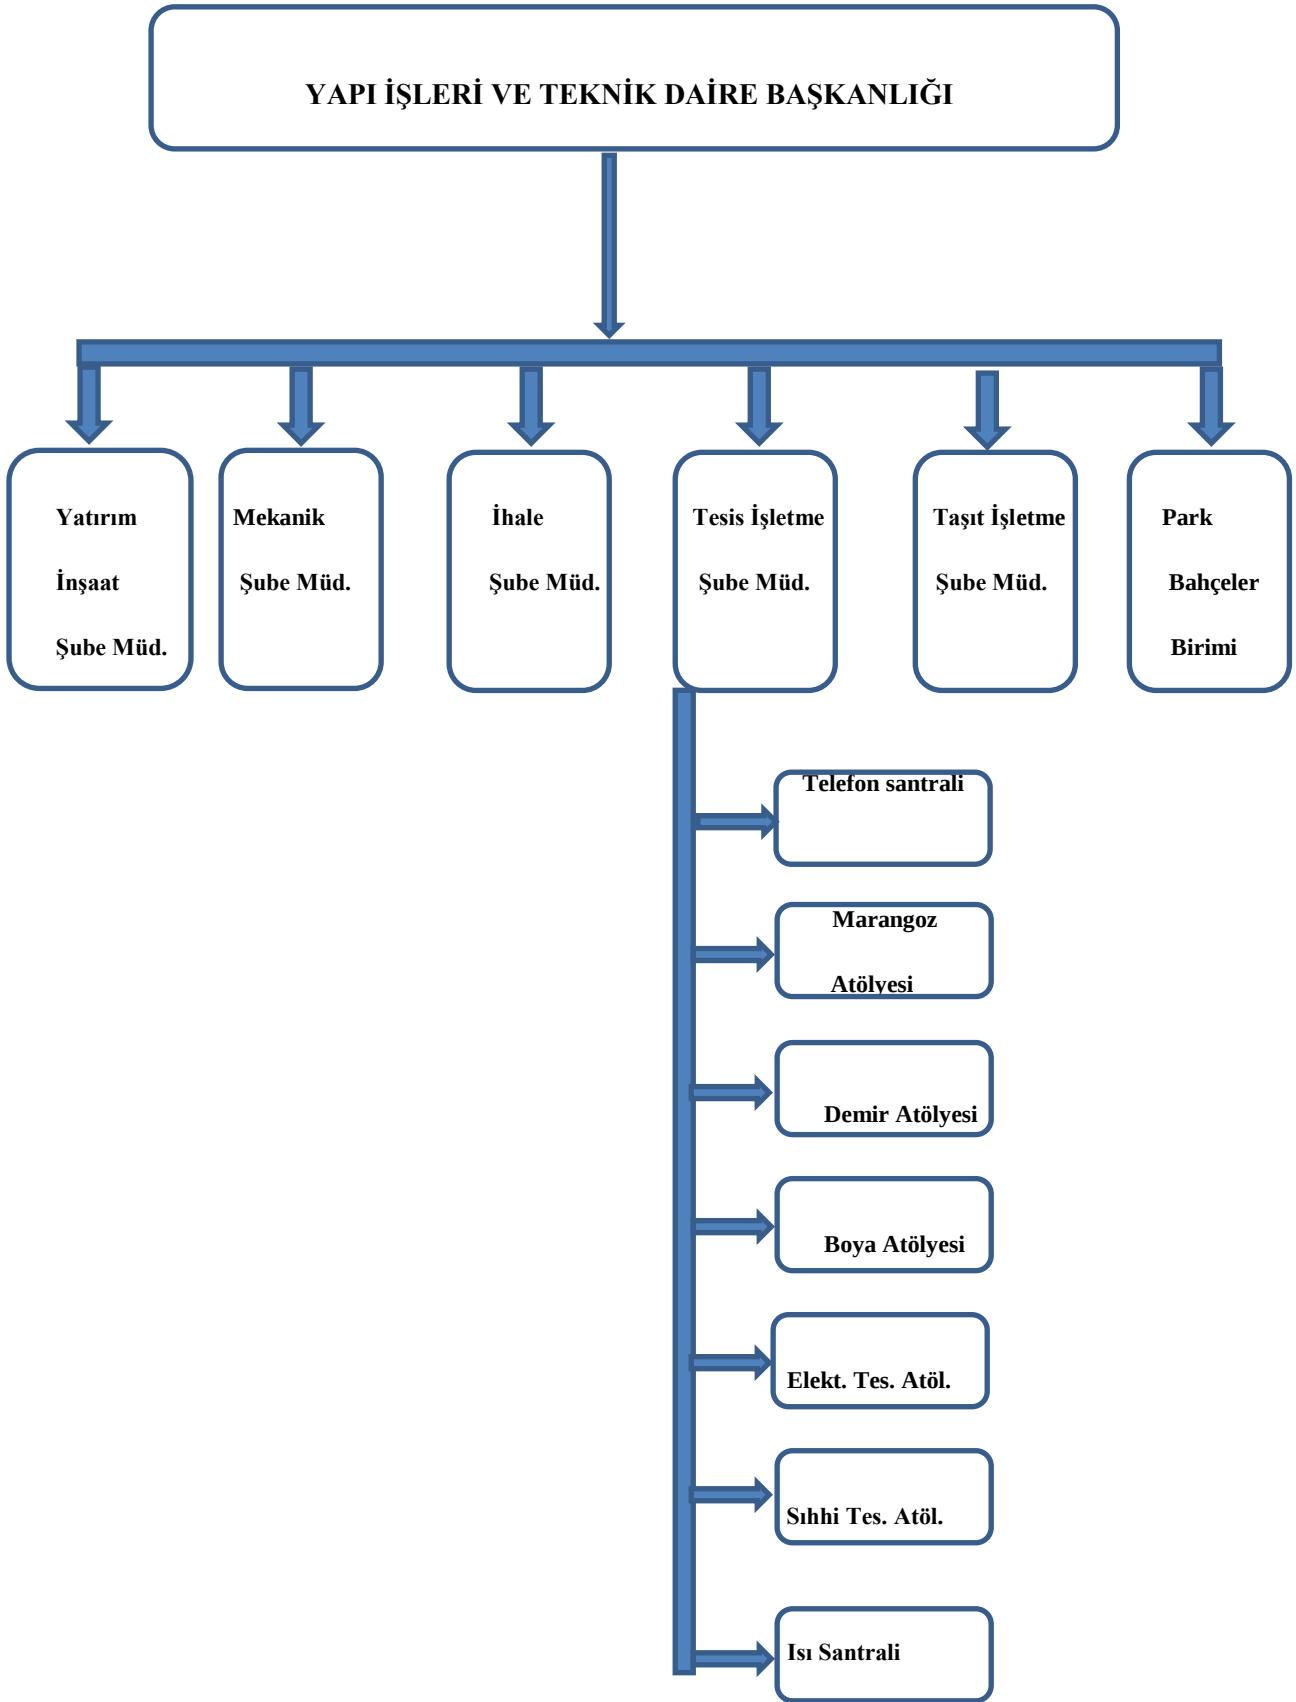

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Tablo13. Yazılım ve Bilgisayarlar					
Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Öğrencilerin Kullanımına açık bilgisayar sayısı) (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)	Sağlık amaçlı	Toplam
Yazılım					
Masa Üstü Bilgisayar	76				76
Taşınabilir Bilgisayar	8				8

3.1- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

3.3.1. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar				
Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)	Toplam
Projeksiyon	1			1
Slâyt Makinesi				
Tepegöz				
Episkop				
Barkot Okuyucu	2			2
Baskı Makinesi				
Fotokopi Makinesi	3			3
Faks	3			3
Fotoğraf Makinesi				
Kameralar				
Televizyonlar	1			1
Tarayıcılar	9			9
Müzik Setleri	2			2
Mikroskoplar				
DVD ler				

3.2- Tesis, Makine ve Cihazlar Listesi

Tablo 20. Tesis, Makine ve Cihazlar Listesi *						
Hesap Kodu	I. Düzey Kodu	II.Düzey Kodu	DAYANIKLI TAŞINIRLAR	Ölçü Birimi	2015 'de alınan	Toplam Miktar
253	02	1	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	Adet	0	1
253	02	2	İnşaat Makineler ve Aletleri	Adet	3	8
253	02	3	Atölye Makineleri ve Aletleri	Adet	1	198
253	02	4	İş Makineleri ve Aletleri	Adet	0	14
253	02	5	Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineleri ve Aletleri	Adet	0	10
253	02	8	Etiketleme ve Numaralan. Makineleri	Adet	0	1
253	02	10	Matbaacılıkta kullanılan Makine ve Aletleri	Adet	0	2
253	03	1	Yıkama, Tem., Ütül., Cihaz ve Araçları	Adet	1	2
253	03	2	Beslenme / Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	Adet	1	4
253	03	3	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	Adet	0	4
253	03	4	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	Adet	0	13
253	03	5	Tıbbi ve Biy. Amaçlı Kull. Cihaz ve Aletler	Adet	0	0
253	03	6	Araşt. Ve Ürt. Amaçlı Cihaz ve Aletler	Adet	0	12
254	01	1	Otomobiller	Adet	0	14
254	01	2	Yolcu Taşıma Araçları	Adet	0	13
254	01	3	Yük Taşıma Araçları	Adet	0	6
254	01	5	Özel Amaçlı Taşıtlar	Adet	0	9

254	01	6	Mopet ve Motosikletler	Adet	0	0
254	01	7	Motorsuz Kara Araçları	Adet	0	5
255	01	2	Temsil ve Tören Demirbaşları	Adet	0	3
255	01	4	Seyahat Muhafaza ve Taş. Amç. Dem. Nit. Taşınır	Adet	0	1
255	01	5	Hastanede kullanılan Dem. Nit. Taşınır	Adet	0	0
255	02	1	Bilgisayar ve Sunucular	Adet	2	14
255	02	2	Bilgisayar Çevre Birimleri	Adet	5	34
255	02	3	Tekser ve Çoğaltma Makineleri	Adet	0	1
255	02	4	Haberleşme Cihazları	Adet	60	14
255	02	5	Ses Görüntü ve Sunum Cihazları	Adet	0	1
255	02	6	Aydınlatma Cihazları	Adet	0	0
255	02	99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu	Adet	1	15
255	03	1	Büro Mobilyaları	Adet	0	8
255	03	2	Misafirhane, Konaklama ve barınma amaçlı Mob.	Adet	0	0
255	03	3	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	Adet	0	0
255	08	1	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	Adet	0	100
255	08	2	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	Adet	0	82
255	09	2	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	Adet	0	0
255	10	2	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	Adet	0	1
255	10	3	Yangın Söndürme ve Tebdir Cihaz Ve Araçları	Adet	0	6

255	99	1	Seyyar kulübe kabin büfe sandık ve kafesler	Adet	0	2
-----	----	---	--	------	---	---

4- İnsan Kaynakları

4.1- İdari Personel

Tablo 28. İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)			
	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	40		40
Sağlık Hizmetleri Sınıfı			
Teknik Hizmetler Sınıfı	48		48
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı			
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı			
Din Hizmetleri Sınıfı			
Yardımcı Hizmetli Sınıfı	22		22
Toplam	110		110

4.2- İdari Personelin Eğitim Durumu

Tablo 29. İdari Personelin Eğitim Durumu					
	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.L. ve Dokt.
Kişi Sayısı	7	41	39	21	2
Yüzde	6	37	36	19	2

4.3- İdari Personelin Hizmet Süreleri

Tablo 30. İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı						
	1-3 yıl	4-6 yıl	7-10 yıl	11-15 yıl	16-20 yıl	21 yıl üzeri
Kişi Sayısı		4	8	11	38	49
Yüzde		3	7	10	35	45

4.4 - İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

Tablo 31 . İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı						
	23 yaş ve altı	23-30 yaş	31-35 yaş	36-40 yaş	41-50 yaş	51 yaş üzeri
Kişi Sayısı		4	9	11	60	26
Yüzde		3	8	20	55	24

5- Sunulan Hizmetler

2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Tamamlanan İnşaatlar

Tamamlanan İnşaatı Adı	Sözleşmeye Göre İş Bitirme Tarihi	Kapalı Alan (m ²)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	26.03.2015	5.650 m ²
İslahiye Meslek Yüksekokulu	18.04.2015	3.810 m ²
Naci Topçuoğlu MYO VRF sistemleri kurulumu	21.12.2015	
Kültür ve Kongre Merkezi ve AKM Çevre Tanzimi	06.09.2015	
Atletizm Sahası ve İstinat Duvarı Yapımı	20.11.2015	
Bina Tadilat ve Onarımları	17.12.2015	
Zemin Kaplaması ve Drenaj Hattı Yapılması	28.05.2015	
Açık Spor Tesisleri	14.08.2015	
Tıp Fakültesi Laboratuvar Binası Tadilat ve Onarımı	16.06.2015	2.800 m ²

Devam Eden İnşaatlar

Devam Eden İnşaatı Adı	Sözleşmeye Göre İş Bitirme Tarihi	Kapalı Alan (m ²)
Gıda Mühendisliği Ek Laboratuvar Binası İnşaatı	28.12.2015	2.400 m ²
Hangar Binası İnşaatı	26.01.2016	1.950 m ²
Mimarlık Fakültesi Binası İnşaatı	16.12.2016	
Hukuk Fakültesi Binası inşaatı	01.05.2017	12.760 m ²
Su Sporları Merkezi Eğitim Binası	31.03.2016	1.450 m ²
Merkez Laboratuvarı Binası inşaatı	10.03.2016	5.900 m ²
Yol Kaldırım ve Onarımı Yap.	20.07.2016	11.359 m ²

2015 YILI PROJE UYGULAMALARI

5.1-PROJE NO : 2015H032330

PROJE ADI : Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP)

BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 2015-2015

Bu projeye 2015 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımıdan 98.000 TL. , özgelirlerimizden 800.000.TL olmak üzere toplam 898.000,00 TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin yılsonu itibariyle 45.453,60 TL.'sı harcanmıştır.

Harcanan bu ödenek ile 250 yataklı çocuk hastanesi proje ihalesi yapılmış, fakat ihale iptal edildiğinden dolayı ödeme yapılmamıştır. Bu proje dahilinde ayrıca merkez kampüs sınırları içi (5034 ada 1 parsel, 714 ada 1 parsel, Osmangazi Mahallesi 9 pafta 3554 ada) plankote ve kübaj hesabı yaptırılmış, ayrıca eğitim tesislerine zemin etüdü ve Gaziantep Üniversitesine ait 8 adet tesis ve 2.8 km yolun Orman Genel Müdürlüğünden gerekli izinlerin alınabilmesi için izin dosyası hazırlama işi yaptırılmıştır.

5.2-PROJE NO : 1988H031310

PROJE ADI : Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)

BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 1988-2015

Bu projeye 2015 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımıdan 17.000.000 TL. ödenek verilmiş, 2015 yıl sonu itibariyle bu ödeneğin 7.633.519, TL.'sı harcanmıştır. Harcanan bu ödenek ile aşağıdaki işler yapılmıştır.

Bu projeden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bina inşaatı için 2015 yılında 687.175,62 TL harcanarak (toplam 6.446.371,42 TL) %100 oranında tamamlanmış, İslahiye Meslek Yüksekokulu Binası inşaatı 2.518.463,45 TL (toplam 3.513.484,93 TL) harcanarak % 100 oranında tamamlanmış, 2014 yılı içerisinde ihalesi yapılan Hangar Binası İnşaatına 1.399.530,68 TL harcanarak %50 oranında inşaat tamamlanmıştır. Gıda Mühendisliği Ek Laboratuvar Binasına 1.786.609,42 TL harcanarak %90 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır. Mimarlık Fakültesi inşaatı 10.356.860 TL bedel ile ihale edilmiş olup,1.039.776,96 TL harcanarak %10 oranında gerçekleştirme sağlanmış, Hukuk Fakültesi Bina İnşaatı 15.244.420,00 TL bedelle ihale edilmiş olup, henüz ödeme yapılmıştır. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokuluna VRF sistemleri kurulumu işi 205.104,06 TL bedelle ihale edilmiş olup, 201.962,90 TL ödenerek %100 oranında tamamlanmıştır.

5.3-PROJE NO : 1991H030810

PROJE ADI : Kampüs Altyapısı (GAP)

BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 1991-2015

Bu projeye 2015 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 3.000.000 TL. verilmiş, ayrıca 5.500.000 TL ödenek eklenmiştir. 2015 yıl sonu itibariyle bu ödeneğin 5.068.643,08 TL' sı harcanmıştır. Harcanan bu ödenek ile aşağıdaki işler yapılmıştır.

Bu proje kapsamında 2014 yılında ihalesi yapılan Kongre ve Kültür Merkezi Çevre Tanzimi işi için 3.010.062. TL harcanmış olup % 100 oranında tamamlanmış geçici kabulü yapılmıştır. Ayrıca bu projeden eski SMYO binası yıkım işi, işletme müdürlüğü çevresine otopark yapımı, ısı santralinde bulunan sirkülasyon pompalarının tamir ve bakımı, su deposu hidrofor kurulum işi, kule tipi saat yapımı, 2 nolu giriş kapısı ve ilahiyat fakültesine bariyer yapımı, Nurdağı Meslek Yüksekokulu'na transformatör yapımı, kanal tadilatı ve ızgara yapım işi, İslahiye kampüsüne seksiyoner yapımı, çarşı kompleksine yol ve kaldırım yapılması, su deposu yıkılması ve verimlilik testi yapılması işleri doğrudan temin usulüyle yaptırılmıştır.

Altyapı projesi kapsamında Atletizm Sahası ve İstinat Duvarı yapım işi ihalesi yapılmış, 890.685,24 TL olarak kayıt altına alınmış ve iş %100 oranında tamamlanmıştır. Bu proje kapsamında ihalesi yapılan zemin kaplaması ve drenaj hattı yapım işi 812.675,80 TL harcanarak %100 oranında tamamlanmış, Ayrıca bu proje kapsamında kampüs güvenlik sistemi yapım işi 588.230. TL bedelle ihale edilmiş olup, 288.343,77 TL ödeme yapılmış ve işin %50'lik kısmı tamamlanmıştır.

5.4-PROJE NO : 2015H032340

PROJE : Muhtelif İşler (GAP)

BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 2015-2015

Bu projeye 2015 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 890.000 TL. özgelirlerimizden 1.110.000,00 olmak üzere toplam 2.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Ayrıca, özgelirlerimizden 800.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Taşıt alımı için 205.500. TL ödenek verilmiş olup, 49.000. TL'de bu tertibe ödenek eklenmiştir. 2015 yıl sonu itibariyle bu ödeneğin 2.550.248,38 TL' sı harcanmıştır. Harcanan bu ödenek ile aşağıdaki işler yapılmıştır.

Bina Tadilat ve Onarımları projesi kapsamında Tıp Fakültesi Dekanlık eski binasının kreşe dönüştürülmesi tadilatı ve onarımı, İslahiye Meslek Yüksekokulu bünyesinde sera hattı yapılması, personel yemekhanesine zemin kaplaması, muhtelif binalarda çatı onarımları ve tadilatları, kreş ve anaokulu binası tadilatı, spor kompleksi zemin kaplaması, BESYO kondüsyon salonu zemin kaplaması, İletişim Fakültesi iç boya yapımı, Güzel Sanatlar Fakültesi iç boya yapımı doğrudan temin usulüyle yaptırılmıştır.

Bu projeden bina tadilat ve onarımları ihalesi yapılmış 1.758.750,08 TL (KDV ve iş artışı dahil) bedelle sözleşmeye bağlanmış olup, %100 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Ayrıca 4. Dönem gerçekleşmesinden; deney hayvanları binasına zemin döşemesi, İlahiyat Fakültesi binasına çatı izolasyonu, 2 nolu yemekhane binasına cam tamirâtı, ve TÖMER binasına pvc yer döşemesi yapılması işleri doğrudan temin usulüyle yapılmıştır. Bu proje kapsamında taşıt alımı için ayrılan ödenekle, DMO'dan bir adet 35+1+1 otokar sultan mega otobüs satın alınmış, 253.853,40 TL ödeme yapılmıştır.

KAMULAŞTIRMA

Bu ödenekte 2015 yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımlarından 2.000. TL başlangıç ödeneği bulunmakta olup, ayrıca bu tertibe 5.286.000 TL ödenek eklenerek toplam ödenek 5.288.000 TL olmuştur. Bu ödenekle 5.287.251,08 TL kamulaştırılan alanların sahiplerine ödeme yapılmıştır.

5.5-PROJE NO : 1992H050160

PROJE ADI : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)

BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 1992-2015

Bu projeye 2015 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 2.000.000,00 ödenek verilmiş olup, 1.260.000. TL Milli Piyango idaresinden hibe edilerek toplam ödenek 3.260.000. TL olmuştur. Bu ödenekten 2015 yılı sonu itibarıyla 2.312.624,61 TL harcanmıştır.

2013 yılında ihalesi yapılan Nizip Su Sporları Merkezi projesinde yer değişikliği yapılmış ve Alleben Göleti civarına taşınmış olup, 737.537,30 TL harcanarak olup %30 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Spor kompleksi civarına yapılan Açık ve kapalı Spor Tesisleri yapılması işi 1.575.087,32 TL bedelle ihale edilmiş olup, %100 oranında tamamlanmıştır.

BİTEN PROJELER

İŞİN ADI	İSLAHİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİNASI İNŞAATI
TOPLAM MALİYET (İş artışı , KDV dahil)	3.513.484,93
2015 YILI HARCAMASI	2.518.463,45
BAŞLANGIÇ TARİHİ	12.08.2014
BİTİŞ TARİHİ	18.04.2015
TOPLAM KAPALI ALAN	3.810 m2
AÇIKLAMA: 42 adet ofis, 1 adet toplantı salonu, 11 adet derslik, 7 adet laboratuvar, 1 adet amfi , kantin ve yemekhane bulunmaktadır.	





İŞİN ADI	İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNASI
TOPLAM MALİYET (İş artışı , KDV DAHİL)	6.446.371,42
2015 YILI HARCAMASI	687.175,62
BAŞLANGIÇ TARİHİ	12.11.2013
BİTİŞ TARİHİ	26.03.2015
TOPLAM KAPALI ALAN	5.650 m ²
AÇIKLAMA : B Bloкта 4 adet amfi ve derslikler, C Bloкта idari ofisler ve yönetici odaları bulunmaktadır.	





İŞİN ADI	AÇIK SPOR TESİSLERİ
TOPLAM MALİYET (KDV dahil)	1.575.087,32
2015 YILI HARCAMASI	1.575.087,32
BAŞLANGIÇ TARİHİ	04.12.2014
BİTİŞ TARİHİ	14.08.2015
TOPLAM KAPALI ALAN	
AÇIKLAMA : : 2 adet basketbol sahası, 1 adet futbol sahası 2 adet tenis kortu, 1 adet idari binadan oluşmaktadır.	





İŞİN ADI	NACİ TOPÇUOĞLU MYO VRF SİSTEMLERİ KURULUMU
TOPLAM MALİYET (KDV dahil)	205.104,06
2015 YILI HARCAMASI (İş eksilişi olmuştur)	201.962,90
BAŞLANGIÇ TARİHİ	27.11.2015
BİTİŞ TARİHİ	21.12.2015
TOPLAM KAPALI ALAN	
AÇIKLAMA : Yüksekokulda bulunan idari bölüme soğutma ve ısıtma sistemleri yapımı işinde 38 adet klima kurulmuştur.	





İŞİN ADI	KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ ÇEVRE TANZİMİ YAPILMASI
TOPLAM MALİYET (KDV dahil)	205.104,06
2015 YILI HARCAMASI (İş eksilişi olmuştur)	201.962,90
BAŞLANGIÇ TARİHİ	27.11.2015
BİTİŞ TARİHİ	06.09.2015
TOPLAM KAPALI ALAN	
AÇIKLAMA :	



İŞİN ADI	ATLETİZM SAHASI VE İSTİNAT DUVARI YAPIMI
İHALE BEDELİ (KDV DAHİL)	890.685,24
2015 YILI HARCAMASI	883.695,42
BAŞLANGIÇ TARİHİ	13.07.2015
BİTİŞ TARİHİ	20.11.2015
TOPLAM KAPALI ALAN	
AÇIKLAMA : Kongre Kültür Merkezi etrafına korkuluk yapılması, çevre düzenlemesi yapılması, trafo ve MYO çevresinin düzenlenmesi işi yaptırılmıştır.	







İŞİN ADI	ZEMİN KAPLAMASI VE DRENAJ HATTI YAPIMI
İHALE BEDELİ (KDV DAHİL)	812.675,80
2015 YILI HARCAMASI	812.675,80
BAŞLANGIÇ TARİHİ	20.03.2015
BİTİŞ TARİHİ	28.05.2015
TOPLAM KAPALI ALAN	
AÇIKLAMA : Çarşı kompleksine zemin kaplaması ve drenaj hattı yapılmıştır.	





İŞİN ADI	BİNA TADİLAT VE ONARIMLARI YAPIMI
İHALE BEDELİ (KDV DAHİL)	1.758.750,08
2015 YILI HARCAMASI (İş eksilişi vardır)	1.758.682,32
BAŞLANGIÇ TARİHİ	03.08.2015
BİTİŞ TARİHİ	17.12.2015
TOPLAM KAPALI ALAN	
AÇIKLAMA : MYO C blok bina boyası, taşra birimlerinde basketbol sahası, Nizip yerleşkesinde güvenlik kulübesi, AKM çevresi taban tuğlası kaplaması, 2 nolu yemekhane bina çevresi çimlendirme, Nizip MYO çatı tamirâtı vb. işler yapılmıştır.	







DEVAM EDEN PROJELER

İŞİN ADI	GIDA MÜHENDİSLİĞİ EK LABORATUVAR BİNASI İNŞAATI
İHALE BEDELİ (KDV DAHİL)	1.982.152,20 TL
2015 YILI HARCAMASI	1.786.609,42
BAŞLANGIÇ TARİHİ	20.02.2015
BİTİŞ TARİHİ	28.12.2015
TOPLAM KAPALI ALAN	2.426 m ²
AÇIKLAMA : 2 adet öğretim görevlisi ofisi, 4 adet öğrenci laboratuvarı, 4 adet öğretim görevlisi laboratuvarı, 4 adet teknisyen odası bulunmaktadır.	





İŞİN ADI	MERKEZİ LABORATUVAR BİNA İNŞAATI
TOPLAM MALİYET (İş artışı ve KDV dahil)	6.732.165,80
2015 YILI HARCAMASI	4.678.426,20
BAŞLANGIÇ TARİHİ	27.10.2014
BİTİŞ TARİHİ	10.03.2016
TOPLAM KAPALI ALAN	5.900 m ²
AÇIKLAMA : 3 katlı olup 2 bloktan oluşmaktadır. A blokta 1 adet konferans salonu, kafeterya, toplantı salonu, sergi salonu, idari ofisler ve laboratuvarlar bulunmaktadır. B blokta çok sayıda laboratuvar yer almaktadır. Bu proje BAP projesi kapsamında yapılmaktadır.	



İŞİN ADI	HANGAR BİNA İNŞAATI
TOPLAM MALİYET (KDV dahil)	2.797.780,00
2015 YILI HARCAMASI	1.399.530,68
BAŞLANGIÇ TARİHİ	11.02.2015
BİTİŞ TARİHİ	26.01.2016
TOPLAM KAPALI ALAN	1.976 m ²
AÇIKLAMA : 1 adet uçak hangarı, 1 adet atölye, 1 adet simülâtör odası, 9 adet ofis, 3 adet derslik, 1 adet kütüphane ve 1 adet dinlenme odası bulunmaktadır.	



İŞİN ADI	SU SPORLARI MERKEZİ EĞİTİM BİNASI İNŞAATI
TOPLAM MALİYET (KDV dahil)	2.807.220,00
2015 YILI HARCAMASI	737.537,30
BAŞLANGIÇ TARİHİ	17.11.2014
BİTİŞ TARİHİ	31.03.2016
TOPLAM KAPALI ALAN	1.450 m ²
AÇIKLAMA 1 adet seminer salonu, 1 adet yemekhane+mutfak, 15 adet sporcu ve antrenör odası, 1 adet su sporları izleme terası.	





İŞİN ADI	MİMARLIK FAKÜLTESİ BİNASI İNŞAATI
TOPLAM MALİYET(KDV dahil)	10.356.860,00
2015 YILI HARCAMASI	1.039.776,96
BAŞLANGIÇ TARİHİ	05.08.2015
BİTİŞ TARİHİ	16.12.2016
TOPLAM KAPALI ALAN	11.359 m2
AÇIKLAMA : 1 adet çok amaçlı salon, 63 adet ofis, 3 adet amfi, 1 adet toplantı salonu, 8 adet derslik, 21 adet stüdyo, 6 adet atölye , 5 adet depo bulunmaktadır.	



İŞİN ADI	KAMPÜS GÜVENLİK SİSTEMİ YAPILMASI
TOPLAM MALİYET(KDV dahil)	588.230,00
2015 YILI HARCAMASI	288.343,77
BAŞLANGIÇ TARİHİ	23.10.2015
BİTİŞ TARİHİ	19.02.2016
TOPLAM KAPALI ALAN	11.359 m2
AÇIKLAMA : Kampüs Güvenlik Sistemi 54 adet 5MPIP kamera, 2 adet 48 TB kayıt server, 6600 metre 8 coresm fiber optik kablo, 1 adet plaka okuma sistemiyle kurulmuş olup, işin %50'si tamamlanmış ve Üniversitenin ana yolları kayıt altına alınmıştır.	





İŞİN ADI	HUKUK FAKÜLTESİ BİNASI İNŞAATI
TOPLAM MALİYET (KDV dahil)	15.244.420,00
2015 YILI HARCAMASI	-
BAŞLANGIÇ TARİHİ	18.12.2015
BİTİŞ TARİHİ	01.05.2017
TOPLAM KAPALI ALAN	12.760 m2
AÇIKLAMA : A blokta 6 adet amfi, 1 adet kafeterya, 1 adet mahkeme salonu, 6 adet derslik, 1adet ofis, B blokta 62 adet ofis, teras ve dinlenme salonu C blokta 3 adet okuma salonu, 3 adet kulüp odası, 1 adet kütüphane, 1 adet arşiv, 1 adet internet araştırma odası.	

İŞİN ADI	YOL, KALDIRIM VE ONARIMI YAPILMASI
TOPLAM MALİYET(KDV dahil)	3.093.820,76
2015 YILI HARCAMASI	-
BAŞLANGIÇ TARİHİ	23.11.2015
BİTİŞ TARİHİ	20.08.2016
TOPLAM KAPALI ALAN	
AÇIKLAMA: Üniversite ring hattında bulunan deforme durumundaki kaldırımlar komple sökülerek taban tuğlası kaplanacak, kampüs ana girişte düzenleme yapılacaktır. Ayrıca, yaklaşık 27.000 m ² alanda sulama sistemiyle birlikte çimlendirme yapılacaktır.	

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A. Birim Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
YAPI VE ALT YAPI HAZIRLAMA / GELİŞTİRME STRATEJİLERİ	Hedef-1 .Mimarlık Fakültesi binasının 2016 yılı içerisinde, Hukuk Fakültesi binası inşaatının 2017 yılı içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir.
	Hedef-2 Üniversitenin ihtiyaç duyduğu altyapı ve yenileme çalışmalarının tamamlanması sağlanacaktır.
	Hedef-3 Merkez Kampus içerisinde bulunan eski binaların tamirat ve tadilat işlerinin tamamlanması.
	Hedef-4 İhtiyaç duyulan hayvan deney laboratuvarının tadilatı tamamlanmıştır. Ayrıca, bu projede Merkezi etik kurulunun yönergesi doğrultusunda Üniversitemizin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı onaylı bir ünite de yer almaktadır.
	Hedef-5 Öğrenci ve öğretim üyesi sosyal hizmet binalarının artırılması için kaynak arama çalışmalarının ve bu çerçevede bağışlar ve vakıf projeleri yoluyla kaynak temini çalışmalarının yapılması.
	Hedef-6 Su Sporları Merkezi ve Merkezi Laboratuvar Bina inşaatları devam etmekte olup, 2016 yılı içerisinde tamamlanması sağlanacaktır.
	Hedef-7 Üniversitemizde güvenliği arttırmak amacıyla , kampüs güvenlik sistemi kurulumu 2016 yılında tamamlanması sağlanacaktır.
	Hedef -8 Üniversite ring hattında bulunan deforme durumundaki kaldırımlar komple sökülerek taban tuğlası kaplanacak, kampüs ana girişte düzenleme yapılacaktır.
	Hedef-9 Üniversitemiz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin yerinde eğitim yapmaları amacıyla yapılan hangar binasının 2016 yılı Ocak ayında tamamlanması hedeflenmektedir.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

Tablo 52. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali							
Kod	Gider Türleri	Bütçe Başlangıç Ödeneği	Eklenen (+)	Düşülen (-)	Yılsonu Ödeneği	Harcama	Harcama (%)
01	Personel Giderleri	3.764.000.	359.100.	-	4.123.100.	4.123.095.	% 100
02	Sos. Güv. Kur. D.Prim Gideri	768.000.	6.000.		774.000.	769.877.	% 99
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	815.000.	334.000.	1.000	1.148.000.	1.117.479	% 97
05	Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
06	Sermaye Giderleri	24.305.500.	13.695.000.	-	38.000.500	23.151.593	% 61
	GENEL TOPLAM	29.652.500.	14.394.100.	1.000.	44.045.600.	29.162.044.	% 66

Tablo 53. Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali							
Kod	Gider Türleri	Bütçe Başlangıç Ödeneği	Eklenen(+)	Düşülen(-)	Yılsonu Ödeneği	Harcama	Harcama (%)
01	Genel Kamu Hizmetleri	6.266.000.	699.100.	1.000.	6.964.100.	6.680.619.	% 96
03	Kamu Düz. ve Güv. Hiz.	-	-	-	-	-	-
08	Dinlenme, Kült ve Din Hiz.	-	-	-	-	-	-
09	Eğitim Hiz.	23.386.500.	13.695.000.	-	37.081.500.	22.481.425.	% 61
	GENEL TOPLAM	29.652.500.	14.394.100.	1.000.	44.045.600.	29.162.044	% 66

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Tablo70. Performans Sonuçları Değerlendirme				
Stratejik Amaç ...	Yapı ve Alt Yapı Hazırlama ve Geliştirme			
Stratejik Hedef ...	Üniversitenin yapı, altyapı ve yenileme çalışmalarının tamamlanması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	Üniversitemizde ihtiyaç duyulan bina ve ek bina eksikliklerinin tamamlanması sağlanacaktır.			
Performans Göstergesi	Hedef (2014 yılı)	Yıl Sonu Gerçekleşme	Hedefin Gerçekleşme Oranı (%)	Hedefin Sapma Oranı (%)
Çarşı projesinin tamamlanma oranı	100	100	100	0
Performans Sonuçlarının Analizi	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası 2015 yılı Mart ayında tamamlanmıştır.			
Tablo70. Performans Sonuçları Değerlendirme				
Stratejik Amaç ...	Yapı ve Alt Yapı Hazırlama ve Geliştirme			
Stratejik Hedef ...	Üniversitenin yapı, altyapı ve yenileme çalışmalarının tamamlanması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	Üniversitemizde ihtiyaç duyulan bina ve ek bina eksikliklerinin tamamlanması sağlanacaktır.			
Performans Göstergesi	Hedef (2014 yılı)	Yıl Sonu Gerçekleşme	Hedefin Gerçekleşme Oranı (%)	Hedefin Sapma Oranı (%)
İnşaatın tamamlanma oranı	100,00	100,00	100	0
Performans Sonuçlarının Analizi	İslahiye Meslek Yüksekokulu Binası 2015 yılı Nisan ayında tamamlanmıştır.			
Stratejik Amaç ...	Yapı ve Alt Yapı Hazırlama ve Geliştirme			
Stratejik Hedef ...	Üniversitenin yapı, altyapı ve yenileme çalışmalarının tamamlanması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	Üniversitemizde ihtiyaç duyulan bina ve ek bina eksikliklerinin tamamlanması sağlanacaktır.			

Performans Göstergesi	Hedef (2014 yılı)	Yıl Sonu Gerçekleşme	Hedefin Gerçekleşme Oranı (%)	Hedefin Sapma Oranı (%)
İnşaatın tamamlanma oranı	100,00	100,00	100	0
Performans Sonuçlarının Analizi	Kongre ve Kültür Merkezi Çevre Tanzimi, Atletizm Sahası ve İstinat Duvarı yapım, Zemin Kaplaması ve Drenaj Hattı yapımı, Açık Spor Tesisleri ve Naci Topçuoğlu MYO VRF sistemleri kurulumu işleri %100 oranında tamamlanarak hedef gerçekleştirilmiştir . Ayrıca Kampüs Güvenlik Sistemi yapım işinde %50 oranında gerçekleşme olmuş, 2016 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.			
Tablo70. Performans Sonuçları Değerlendirme				
Stratejik Amaç ...	Yapı ve Alt Yapı Hazırlama ve Geliştirme			
Stratejik Hedef ...	Üniversitenin yapı, altyapı ve yenileme çalışmalarının tamamlanması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	Üniversitemizde ihtiyaç duyulan bina ve ek bina eksikliklerinin tamamlanması sağlanacaktır.			
Performans Göstergesi	Hedef (2016 yılı)	Yıl Sonu Gerçekleşme	Hedefin Gerçekleşme Oranı (%)	Hedefin Sapma Oranı (%)
İnşaatın tamamlanma oranı	100,00	100,00	100,00	0
Performans Sonuçlarının Analizi	Merkezi Laboratuvar (BAP Projesi) Binası inşaatı 2016 yılı Mart ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.			
Tablo70. Performans Sonuçları Değerlendirme				
Stratejik Amaç ...	Yapı ve Alt Yapı Hazırlama ve Geliştirme			
Stratejik Hedef ...	Gelişmekte olan Üniversitemizi hem eğitim yönünden hem de sosyal faaliyetler yönünden daha cazip bir yer haline getirmek.			
Performans Hedefi	Üniversitemizi ve Gaziantep’i ulusal ve uluslararası pek çok etkinliğin düzenlendiği bir merkez haline getirecek, Üniversite personelinin ve öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirebileceği, spor yapabileceği bir alan haline gelmesi hedeflenmektedir.			
Performans Göstergesi	Hedef (2016 yılı)	Yıl Sonu Gerçekleşme	Hedefin Gerçekleşme Oranı (%)	Hedefin Sapma Oranı (%)
İnşaatın tamamlanma oranı	100,00	100,00	100,0	0

Performans Sonuçlarının Analizi	Bu proje içerisinde Su Sporları Merkezi Eğitim Binası inşaatının 2016 yılı Mart ayında tamamlanması planlanmaktadır.			
Tablo70. Performans Sonuçları Değerlendirme				
Stratejik Amaç ...	Yapı ve Alt Yapı Hazırlama ve Geliştirme			
Stratejik Hedef ...	Üniversitenin yapı, altyapı ve yenileme çalışmalarının tamamlanması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	Üniversitemizde ihtiyaç duyulan bina ve ek bina eksikliklerinin tamamlanması sağlanacaktır.			
Performans Göstergesi	Hedef (2016 yılı)	Yıl Sonu Gerçekleşme	Hedefin Gerçekleşme Oranı (%)	Hedefin Sapma Oranı (%)
İnşaatın tamamlanma oranı	100,00	100,00	100,00	0
Performans Sonuçlarının Analizi	Mimarlık Fakültesi binası inşaatının 2016 yılı içerisinde, Hukuk Fakültesi binası inşaatının ise 2017 yılı Mayıs ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.			
Tablo70. Performans Sonuçları Değerlendirme				
Stratejik Amaç ...	Yapı ve Alt Yapı Hazırlama ve Geliştirme			
Stratejik Hedef ...	Üniversitenin yapı, altyapı ve yenileme çalışmalarının tamamlanması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	Üniversitemizde ihtiyaç duyulan bina bakım ve onarımlarının tamamlanması sağlanacaktır.			
Performans Göstergesi	Hedef (2016 yılı)	Yıl Sonu Gerçekleşme	Hedefin Gerçekleşme Oranı (%)	Hedefin Sapma Oranı (%)
İnşaatın tamamlanma oranı	100,00	100,00	100,00	0
Performans Sonuçlarının Analizi	Üniversitemiz kampüsü sınırlarında ve taşra birimlerinde bulunan binaların ihtiyaç duyulan bakım ve onarımları 2015 yılı Aralık ayında tamamlanmıştır.			

Tablo70. Performans Sonuçları Değerlendirme				
<i>Stratejik Amaç ...</i>	Yapı ve Alt Yapı Hazırlama ve Geliştirme			
<i>Stratejik Hedef ...</i>	Üniversitenin yapı, altyapı ve yenileme çalışmalarının tamamlanması sağlanacaktır.			
<i>Performans Hedefi</i>	Üniversitemizde ihtiyaç duyulan bina ve ek bina eksikliklerinin tamamlanması sağlanacaktır.			
<i>Performans Göstergesi</i>	Hedef (2016 yılı)	Yıl Sonu Gerçekleşme	Hedefin Gerçekleşme Oranı (%)	Hedefin Sapma Oranı (%)
İnşaatın tamamlanma oranı	100,00	100,00	100,00	0
<i>Performans Sonuçlarının Analizi</i>	Merkezi Laboratuvar (BAP Projesi) Binası inşaatı 2016 yılı Mart ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.			

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

Başkanlığımız ve bağlı birimlerde bulunan personelin özverili bir şekilde çalışması. Personelin çalışmalarda ihtiyaç duyduğu bilişim teknolojisine sahip olması.

B- Zayıflıklar

Başkanlığımıza bağlı birimlerde çalışan personelin yeterli sayıda olmaması, taşıt, araç ve gereçlerin eskimiş ve ihtiyaca cevap vermeyecek sayıda olması.

C- Değerlendirme

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında bulunan mesai arkadaşlarımız, Üniversitemiz için özverili bir şekilde çalışmaktadır.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığının ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte daha sağlıklı ve başarılı çalışma ortamı sağlayan bir hizmet binasının yapılması.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 12 / 01 / 2016

İrfan KORKMAZ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı
